TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Sarjetas = 840,50 m
Tubo de concreto simples Ø300 mm = 222,00 m
Tubo de concreto simples Ø400 mm = 454,00 m
Tubo de concreto simples Ø600 mm = 27,00 m
Poço de visita Ø600 mm - (80X80Xvar)cm = 02 unid.
Poço de visita Ø400 mm - (60x60xvar)cm = 10 unid.
Boca-de-lobo - (54x91x100)cm = 30 unid.

NOTA:

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA:

Poço de visita Ø600 mm - (80X80Xvar)cm = 02 unid.
Poço de visita Ø400 mm - (60x60xvar)cm = 05 unid.
Boca-de-lobo - (54x91x100)cm = 15 unid.

Que o restante dos BL's e PV's que não foram medidos e que constam como executados, foi porque estes ainda não estavam concluídos quando a obra foi medida. Considerando que, a empresa executora teve seu contrato rescindido, tais serviços tinham urgência de serem finalizados, colocando em risco inclusive os usuários das vias; assim, a Prefeitura concluiu estes trabalhos através de execução direta.

LEGENDA:

PV'S EXECUTADOS PELA CONTRATADA

BL'S EXECUTADOS PELA CONTRATADA

PLANTA DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS - DRENAGEM PLUVIAL

AVENIDA INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO
SEM ESCALA

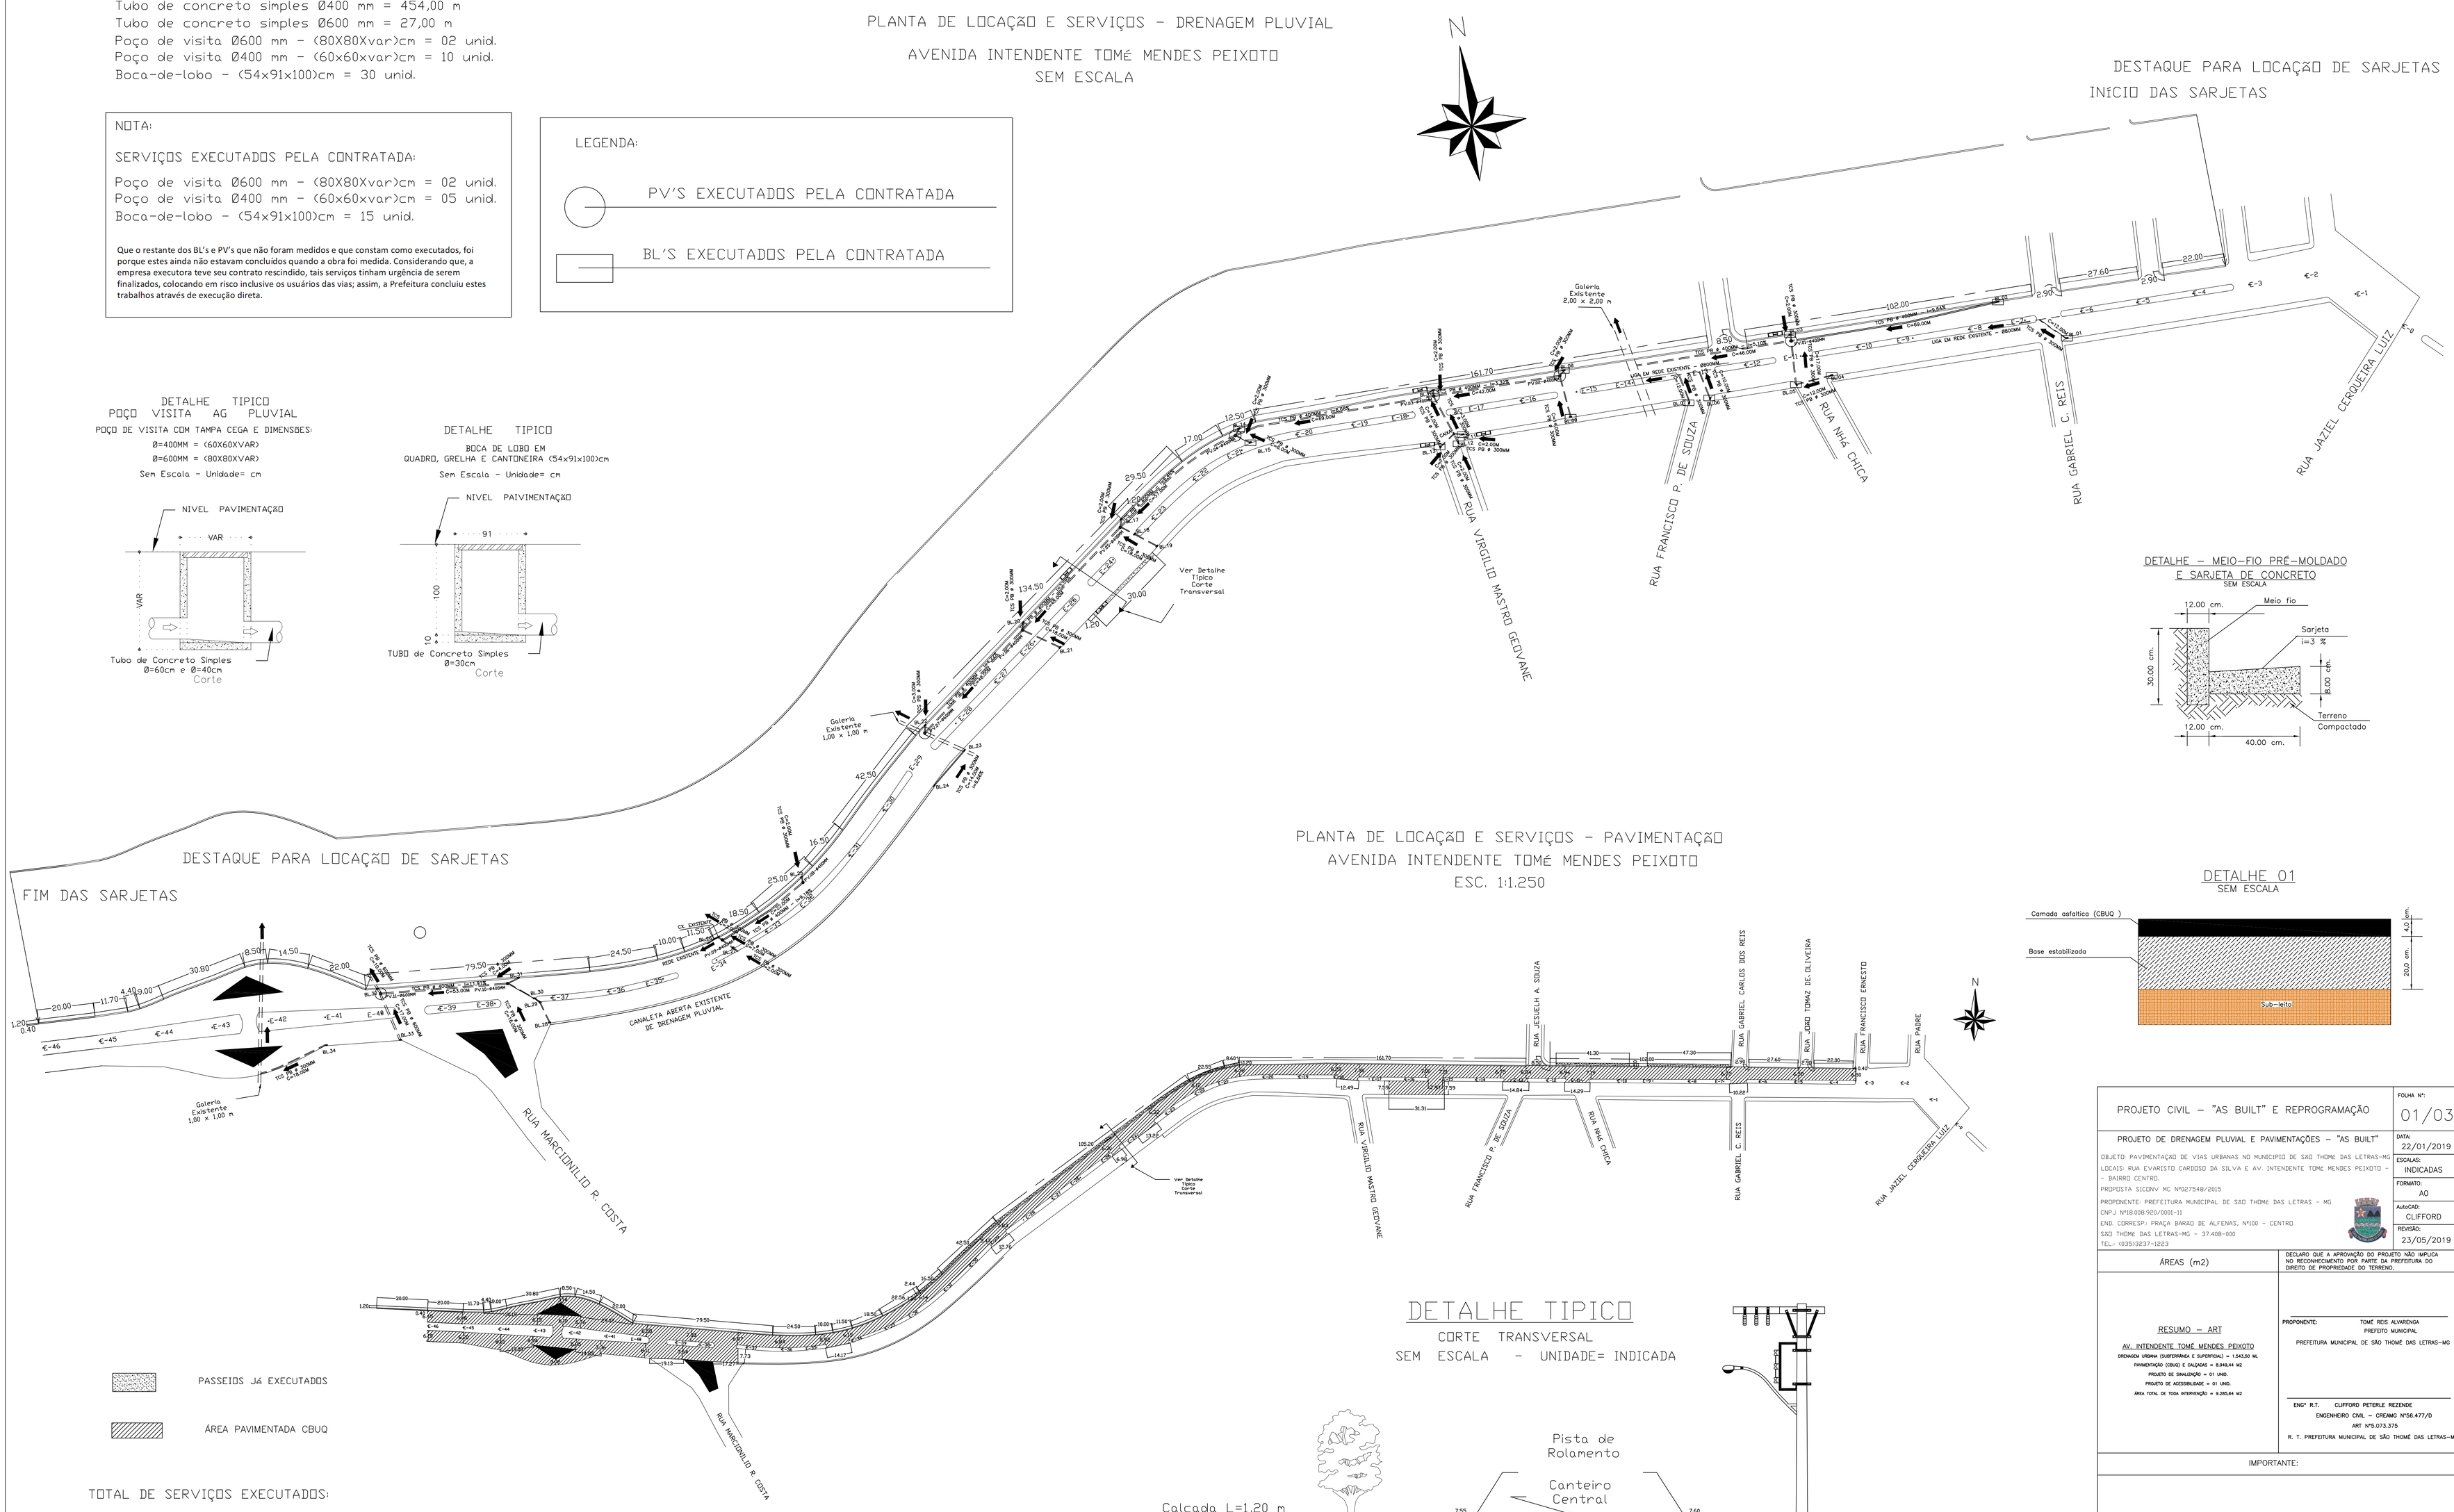

DETALHE TIPICO
POÇO VISITA AG PLUVIAL

POÇO DE VISITA COM TAMPA CEGA E DIMENSÕES:
Ø=400MM = (60X60XVAR)
Ø=600MM = (80X80XVAR)
Sem Escala - Unidade= cm

DETALHE TIPICO

BOCA DE LOBO EM
QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA (54x91x100)cm
Sem Escala - Unidade= cm

DETALHE – MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO E SARJETA DE CONCRETO
SEM ESCALA

PLANTA DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

AVENIDA INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO
ESC. 1:1.250

DETALHE 01
SEM ESCALA

PASSEIOS J4 EXECUTADOS

ÁREA PAVIMENTADA CBUQ

TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

área de reg. e compactação = 8.426,32 m2
área de pavimentação em CBUQ = 8.090,12 m2
Passeios em concreto executados = 318,07 m2

DETALHE TIPICO

CORTE TRANSVERSAL
SEM ESCALA - UNIDADE= INDICADA

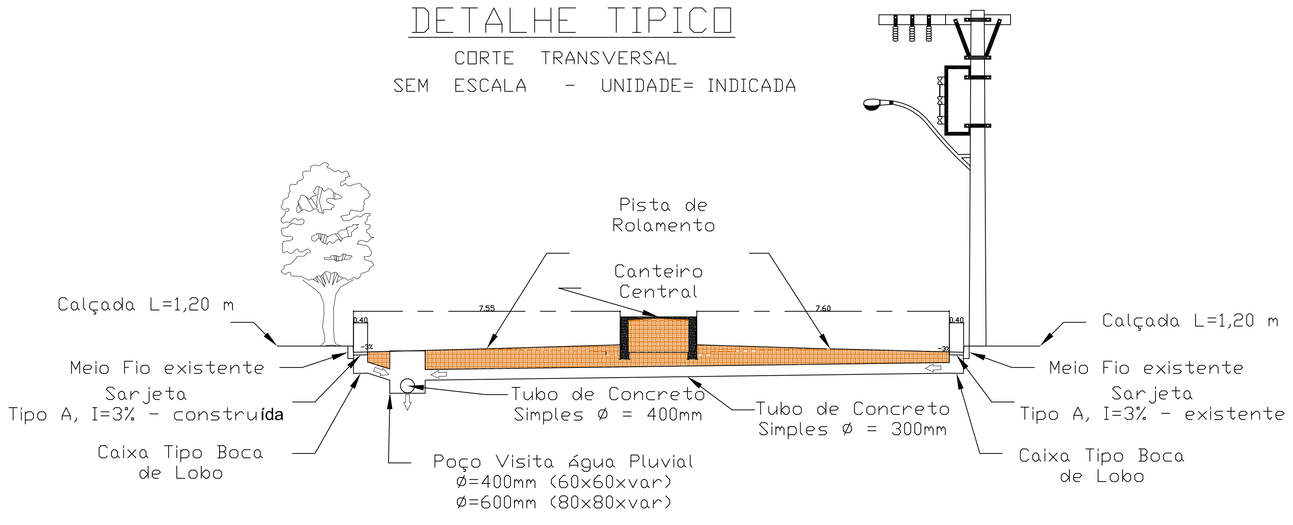

PROJETO CIVIL – "AS BUILT" E REPROGRAMAÇÃO	FOLHA Nº: 01/03
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÕES – "AS BUILT" OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG LOCAIS: RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - - BAIRRO CENTRO. PROPOSTA SICONV MC Nº027548/2015 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS - MG CNPJ Nº18.008.920/0001-11 END. CORRESP: PRAÇA BARÃO DE ALFENAS, Nº100 - CENTRO SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG - 37.408-000 TEL: (035)3237-1223	DATA: 22/01/2019 ESCALAS: INDICADAS FORMATO: A0 AutoCAD: CLIFFORD REVISÃO: 23/05/2019
ÁREAS (m2)	DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
RESUMO – ART AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO DRENAGEM URBANA (SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL) = 1.543,50 ML PAVIMENTAÇÃO (CBUQ) E CALÇADAS = 8.845,44 M2 PROJETO DE SINALIZAÇÃO = 01 UNID. PROJETO DE ACESSIBILIDADE = 01 UNID. ÁREA TOTAL DE TODA INTERVENÇÃO = 8.335,54 M2	PROPONENTE: TOMÉ REIS ALVARENGA PREFEITO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG ENG° R.T. CLIFFORD PETERLE REZENDE ENGENHEIRO CIVIL – CREAMG Nº56.477/D ART Nº5.073.375 R. T. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG
IMPORTANTE:	
DESPACHOS DA P.M.S.T.L.	
